

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2021 год
ТОО "Алматинские тепловые сети"**

Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге



№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты) без НДС, тыс. тенге		Срок исполнения	Место расположения
			план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Капитальные ремонты, реконструкция объектов	комплекс работ	6	6	857 529,59	826 693,32	Исполнено в 2021г.	
1.1.	<i>Реконструкция тепловых сетей от ТК3-14 до ТК 1 ЮК10(2ду325, 907м) (корректировка- 2ДУ-500(463м))</i>	<i>комплекс работ</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>365 964,35</i>	<i>365 964,35</i>	<i>Исполнено 15.11.2021г.</i>	<i>ул. Валиханова между Маметовой и Алимжановой</i>
1.2.	<i>Реконструкция тепловых сетей от ТК 2вв-8 до ТК 2Кд-11</i>	<i>комплекс работ</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>86 724,62</i>	<i>86 724,62</i>	<i>Исполнено 08.12.2021г.</i>	<i>ул. Шагабутдинова от Карасай батыра до Кабанбай батыра</i>
1.3.	<i>Реконструкция тепловых сетей от ТК 2 Кд-11 до ТК 2КД-11/3юг</i>	<i>комплекс работ</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>77 662,01</i>	<i>77 662,01</i>	<i>Исполнено 10.12.2021г.</i>	<i>ул. Шагабутдинова от ул. Кабанбай батыра до Жамбыла</i>
1.4.	<i>Реконструкция тепловых сетей от ТК 2 до Кд-15 до ТК 2Кд-15/4</i>	<i>комплекс работ</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>162 555,35</i>	<i>131 719,08</i>	<i>Исполнено 20.12.2021г.</i>	<i>ул. Досмухамедова от Жамбыла до Шевченко</i>
1.5.	<i>"Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай"</i>	<i>комплекс работ</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>141 759,75</i>	<i>141 759,75</i>	<i>Исполнено 27.12.2021г.</i>	<i>ул. Майлина, 79Г</i>

1.6.	Реконструкция НС МЛЮК	комплекс работ	1	1	22 863,51	22 863,51	Исполнено 22.10.2021г.	ул Жибек-Жолы, №68
2	Государственная экспертиза	работа	8	8	4 128,54	4 128,54	Исполнено 30.12.2021г.	ул. Байзакова, 221 ТОО "АлТС" (скалд)
3	Разработка ПСД	комплекс работ	10	10	71 448,62	71 448,62	Исполнено 28.12.2021г.	ул. Байзакова, 221 ТОО "АлТС" (скалд)
4	Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели	комплект/шт.	20	20	137 054,10	137 053,89	Исполнено в 2021г.	ул. Байзакова, 221 ТОО "АлТС" (скалд)
4.1.	Насос центробежный консольный КМ-80-50-200	комплект	4	4	3 174,00	3 174,00	Исполнено 25.06.2021г.	СВЭР (ТП Энергетик) ул. Донентаева, 2/1
4.2.	Насос центробежный консольный К-160/30	комплект	3	3	3 549,00	3 549,00	Исполнено 25.06.2021г.	НСП -2 ЮВРК Хаджимукана, д.45
4.3.	Насос центробежный консольный Х-65-50-160Б (химический)	комплект	1	1	640,99	640,99	Исполнено 02.11.2021г.	ТП "Алтай" СВЭР ул. Майлина, 79Г
4.4.	Насос погружной оптимальная подача 10м3/ч (ГНОМ)	комплект	2	2	899,48	899,48	Исполнено 05.10.2021г.	АС ул. Байзакова, 221, СЭР ул. Филатова, 21
4.5.	Дизельная электростанция В-400/230	шт.	1	1	1 785,72	1 785,72	Исполнено 28.07.2021г.	СЭР ул. Филатова, 21,
4.6.	Насос сетевой центробежный Подача, м3/ч- 1250; Напор, м- 140;	комплект	1	1	15 750,00	15 750,00	Исполнено 17.09.2021г.	ВЭР Чайковского, 112,
4.7.	Насос центробежный консольный (Комета)	комплект	2	2	264,21	264,00	Исполнено 02.11.2021г.	СВЭР (ТП Энергетик) ул. Донентаева, 2/1
4.8.	Поставка насосных агрегатов для насосной станции №2	комплект	2	2	107 900,00	107 900,00	Исполнено 27.12.2021г.	НС-2 ул. Байзакова, 221
4.9.	Кабельискатель	шт.	4	4	3 090,70	3 090,70	Исполнено 01.11.2021г.	ул. Байзакова, 221 ТОО "АлТС" (скалд)

5	Установка приборов учета тепловой энергии для производственных нужд	комплекс работ/шт.	13	13	18 426,31	18 426,31	Исполнено 14.09.2021г.	ул. Байзакова, 221 ТОО "АлТС" (скалд)
6	Приобретение программных продуктов	комплекс работ/шт./год	2 006	2 006	231 721,14	231 721,14	Исполнено 27.12.2021г.	ул. Байзакова, 221 ТОО "АлТС" (скалд)
7	Запорная, запорно-регулирующая, предохранительная арматура и иное оборудование	комплект	16	16	66 121,15	66 121,15	Исполнено 27.08.2021г.	ул. Жанкожа батыра 2/1 ТОО "АлТС" (скалд)
8	Инструменты и приспособления	шт.	3	3	990,05	990,05	Исполнено 14.09.2021г.	ул. Байзакова, 221 ТОО "АлТС" (скалд)
9	Капитализация	работа	1	1	189 688,94	220 458,31	Исполнено 2021г.	ТОО "АлТС"
	ИТОГО:		2 083	2 083	1 577 108,44	1 577 041,33		

Капитальные ремонты, реконструкция объектов.

1. Реконструкция тепловых сетей ТМ-3 от ТК 3-14 до ТК Гюк-10 в г. Алматы.

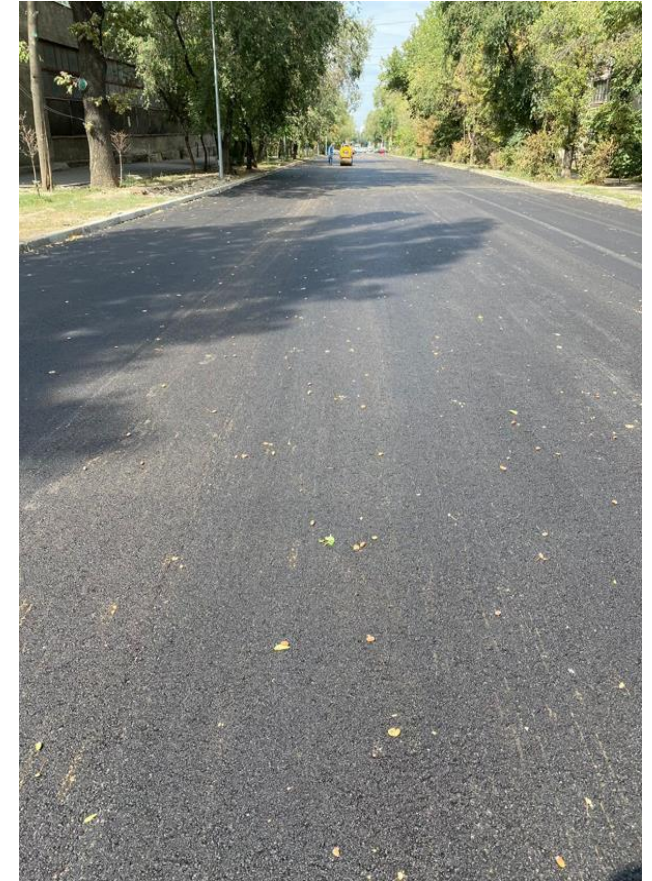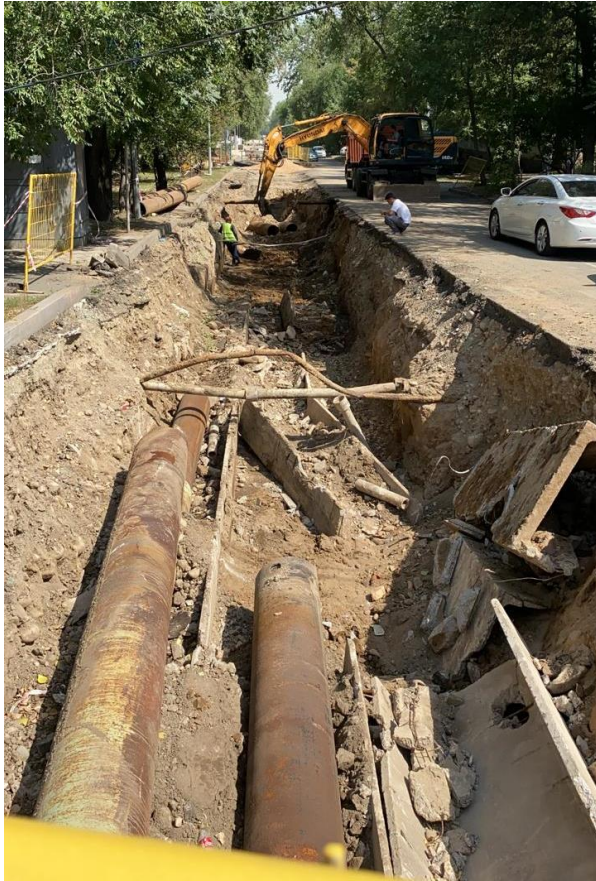


2. Реконструкция тепловых сетей от ТК 2вв-8 до ТК 2КД-11.



3. Реконструкция тепловых сетей от ТК 2Кд-11 до ТК 2КД-11/3юг.




4. Реконструкция тепловых сетей от ТК 2Кд-15 до ТК 2Кд-15/4.

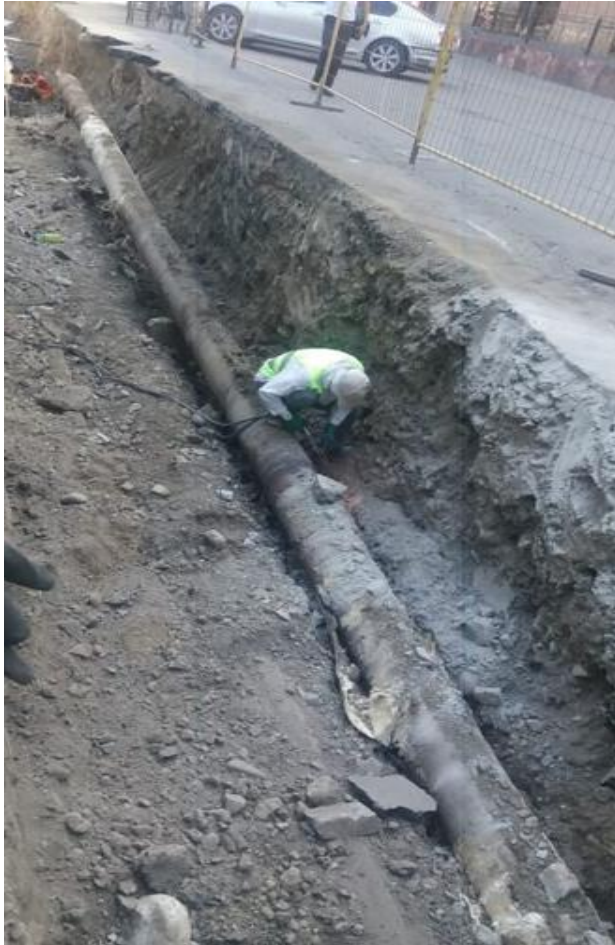

5. Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай.



6. Реконструкция НС МІЮК ул. Жибек-Жолы №68.

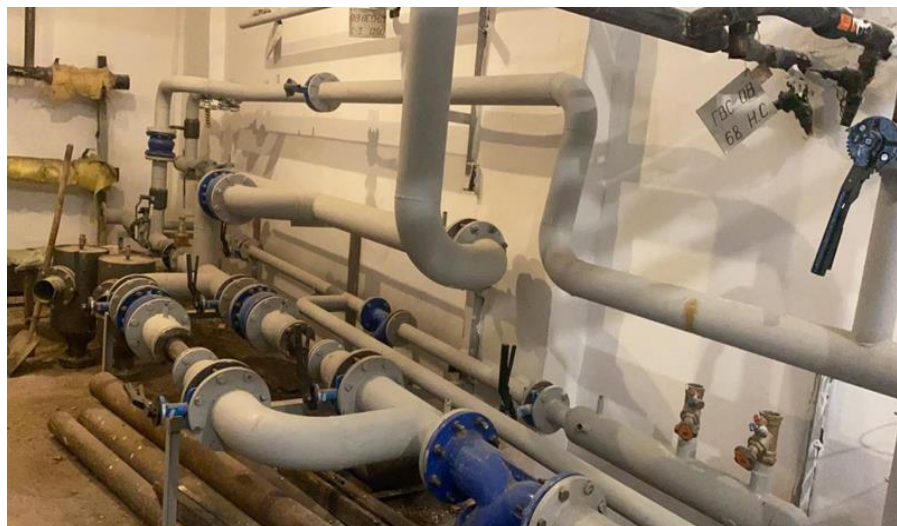

Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели.

1. Насос центробежный консольный моноблочный, подача 50м³/ч



моноблочный, подача 160м³/ч



2. Насос центробежный консольный

3. Агрегат насосный центробежный консольный химический. Подача, м³/ч-25; Напор, м-20.



4. Погружной дренажный насос, Номинальная подача не менее, м³/ч- 10; Номинальный напор не менее, м - 10.



5. Насос сетевой центробежный, подача 1250м3/ч



6. Дизельная электростанция



7. Насос центробежный консольный



8. Насосный агрегат в комплекте



9. Кабель искатель



Установка приборов учета тепловой энергии для производственных нужд

1. Стабилизатор напряжения, импульсный. Инвертор (стабилизатор напряжения)



2. Работа по переоборудованию приборов учета тепловой энергии, смонтированных на котельных ТОО АТКЭ с КМ-5-4 на КМ-5-3



Запорная арматура.

1. *Задвижка клиновая стальная литая DN500, PN25 ГОСТ 5762-2002, с не выдвижным шпинделем, под приварку с патрубком, управление – механический редуктор с штурвалом*



2. Шаровый кран DN500, PN25 предизолированный с редуктором



3. Шаровый кран с редуктором DN500, PN25



4. Клапан обратный DN300, PN25 под приварку, ГОСТ 33423-2015; Клапан обратный DN400, PN25 под приварку, ГОСТ 33423-2015



Инструменты и приспособления.

1. Резчик швов

